




पशुपति क्षेत्र विकास कोष

Pashupati Area Development Trust

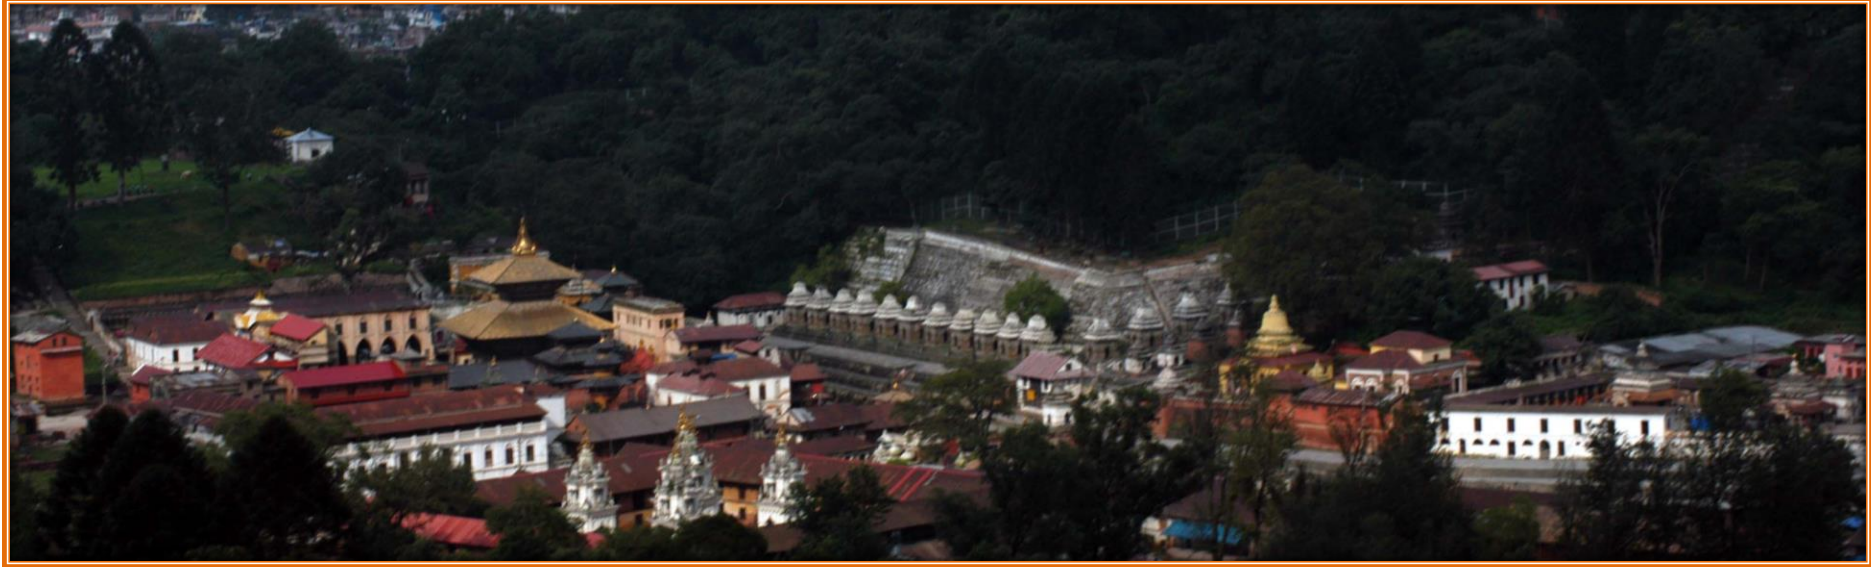

परिचय




- पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ अन्तर्गत अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संगठित संस्थाको रूपमा काठमाण्डौको पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पर्या-पर्यटनको नमुना क्षेत्रतथा हिन्दूहरूको अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा थप व्यवस्थित गर्ने
- आ.व. २०७०/०७१ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन भईरहेकोछ ।



२. लक्ष्य

हिन्दुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थल बनाउनुका साथै यस क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्या-पर्यटनको नमूना क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने।

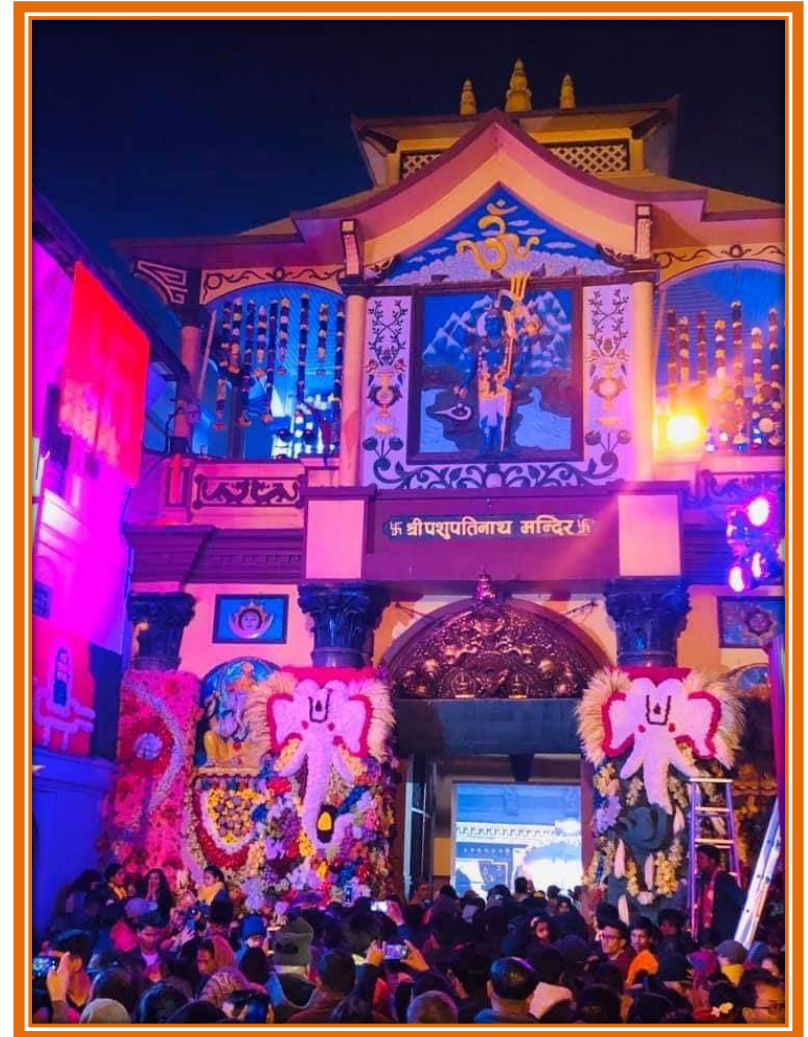



३. प्रमुख क्रियाकलापः

- बृहत्तर गुरुयोजना तयार गर्ने,
- पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अध्ययन-अनुसन्धान, उत्खनन, संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने,
- भवन, मन्दिरको प्राङ्गण, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने,
- हिन्दू दर्शन लगायत पूर्वीय दर्शन सम्बन्धी अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने,
- प्रदुषण नियन्त्रण तथा बागमतीको जल प्रवाह प्रवर्द्धन गर्ने,
- पशुपति क्षेत्र सम्बन्धी प्रचार-प्रसार र सञ्जालीकरण गर्ने।





प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

पशुपति क्षेत्र विकास कोष

१. आ व: २०७७/७८												फा नं २	
२. बजेट उपशीर्षक नं ३२५११५													
३. मन्त्रालय: संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	७. यस अबधिको खर्च रकम र प्रतिशत											सोधभर्ना स्थिति	
४. कार्यक्रम/अयोजनाको नाम: पशुपति क्षेत्र विकास कोष	क.	आन्तरिक		१. नेपाल सरकार:	३५०	२३ प्रतिशत						क. माग गर्नुपर्ने रकम:	
५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल				२. स्थानि:	२. स्थानिय निकाय/संस्था:							ख. माग गरेको रकम:	
६. यस अबधिको बजेट: १५२८				३. जनसहभागिता								ग. प्राप्त हुन बाँकी रकम:	
क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:	ख.	बैदेशिक:	१. ऋण										
(२) संस्था:			२. अनुदान:										
(३) जनसहभागिता:	८	चालु आ.व को हालसम्मको खर्च रकम र प्रातिशत:										प्रातिशत	
ख) बैदेशिक (१) ऋण:	९	कूल लागत मध्ये शुरुदेखि यस अबधिसम्मको कूल खर्च रकम र प्रतिशत:											
(२) अनुदान:	१०	आयोजनाको शुरुदेखि यस अबधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत:											
	११	आयोजनाको कूल शबधि मध्ये बितेको समय:	४ महिना									रकम रु. लाखमा	
क्र सं	कार्यक्रम क्रियाकलापहरू	एकाई	वार्षिक लक्ष			प्रथम चौमासिक लक्ष			चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अबधिसम्म यस आवको प्रगति	सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	

क्र सं	कार्यक्रम क्रियाकलापहरू	एकाई	वार्षिक लक्ष			प्रथम चौमासिक लक्ष			चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आवको प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५

१	अन्नदान क्षेत्रमा प्रसादघर निर्माण कार्य	बटा	१	११.४३	४००	०.२५	२.८६	१००	०.१०	०.२९	१.१४			डि.पि. आर तयार गरि पुरातत्व विभागमा सहमतिको लागि पठाइएको। तर कोषद्वारा तयार पारिएको गुरुयोजना अन्तर्गतको कार्यक्रम भएकाले गुरुयोजना स्वीकृत नभएसम्म कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने हुँदा
२	बृहत् सभा भवन निर्माण कार्य	बटा	१	८.२९	२९०	०.२	१.६६	५८	०.१०	०.१७	०.८३			कार्यक्रम संशोधनको प्रकृयामा जानु पर्ने ।
३	परिक्रमापथ निर्माण कार्य	बटा	१	८.५७	३००	०.३३	२.८६	१००	०.१०	०.२९	०.८६			
४	नेपाल वेदविद्याश्रम मा.वि.को प्लस टु भवन तथा पूर्वाधार विकास कार्य	बटा	१	११.४३	४००	०.२५	२.८६	१००	०.१०	०.२९	१.१४			डि.पि. आर तयार गरि पुरातत्व विभागमा सहमतिको लागि पठाइएको।

क्र.सं.	कार्यक्रम क्रियाकलापहरू	एकाई	वार्षिक लक्ष			प्रथम चौमासिक लक्ष			चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आवको प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	१	२	०	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
५	गोठारटार जग्गामा पूर्वाधार विकास तथा सिमाङ्कन	वटा	१	८.५७	३००	०.३३	२.८६	१००	०.००	०.००		०.००		हालसविक अनिवार्य भएकोले मालपोत तथा नापी कार्यालय संग समन्वय गर्ने कार्य भैरहेको। मालपोत कार्यालयबाट कोषको नाममा जग्गा कायम गर्ने तत्कालिन (२०४६) नेपाल सरकारको निर्णय माग भएकोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिसदको कार्यालयमा संस्कृति मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गरिएको।
६	सुरक्षा अनुगमनका उपकरण सि.सि.टि.भी लगायत जडान कार्य	वटा	१	२.८६	१००	०.२५	०.७१	२५	०.१०	०.०७		०.२८		सुरक्षा निकाय र प्राविधिकहरु संग छलफल चलि रहेको
७	दर्शनमार्गमा पूर्वाधार विकास कार्य	वटा	१	५.७१	२००	०.२५	१.४३	५०	०.१५	०.२१		०.८६		बोलपत्र मूल्यांकन भैरहेको
८	गौशाला भुवनेश्वरी दर्शन मार्ग स्तरोन्नति	वटा	१	११.४३	४००	०.७५	८.५७	३००	०.५०	४.२९		५.७१		कार्य चालू
९	मृगस्थलीमा भू-क्षय नियन्त्रण कार्य	वटा	१	८.५७	३००	०.३३	२.८६	१००	०.१५	०.४३		१.२९		बोलपत्र मूल्यांकन भैरहेको
१०	कैलाश उमाकुण्डमा घेरा पर्खाल तथा हरियाली प्रवर्धन	वटा	१	०.७१	२५	१	०.७१	२५	०.००	०.००		०.००		

[illegible]

				फाराम नं २	
१	२	३	४	५	६
क्र.सं	आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरु	समस्या देखापर्नुका कारणहरु	समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयाशहरु	मविसस समिति(MDAC) मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिएका समस्याहरु	समस्या समाधानका लागि सुझाव
१					
१	चालू कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने	कोभिड १९ को असर	सुरक्षा सावधानी अपनाई काम सुचारु गर्न लगाइएको । आवश्यकतानुसार म्याद थप गरिएको ।		
२	कोषद्वारा तयार पारिएको गुरुयोजनामा परेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या रहेको	गुरुयोजना स्वीकृत भईनसकेको	गुरुयोजनालाई ३ महिना भित्र अन्तिम रुप दिन प्राविधिक समिति गठन भएको ।		
३	गोठाटार जग्गामा पूर्वाधार विकास तथा सिमाङ्कनका लागि जग्गा हाल साविक प्रक्रियामा समस्या	हालसाविक कार्यका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट कोषको नाममा जग्गा कायम गर्ने तत्कालिन नेपाल सरकारको निर्णय माग भएको ।	तत्कालिन (२०४६) को मन्त्रीपरिषद्को निर्णय प्रतिलिपी उपलब्ध गराइदिन संस्कृति मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गरिएको।	मन्त्रीपरिषद्को निर्णय प्रतिलिपी आवश्यक रहेको	



५. हालसम्मको प्रगति (आ.व. २०७७/७८ प्रथम चौमासिक)

सि. नं.	समष्टिगत प्रगति(%)			आ. व. ०७७/७८ को बार्षिक लक्ष्यको तुलनामा प्रगति (%)	
	खर्च	भौतिक	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय
१	७५.५ करोड	७०	५६.२९	३४	२३





भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनर्निर्माण प्रगति

विवरण	सत्तल			मन्दिर			कूल जम्मा
	पूर्ण क्षति	आंशिक क्षति	जम्मा	पूर्ण क्षति	आंशिक क्षति	जम्मा	
क्षतिग्रस्त सम्पदा	२३	१२	३५	३४	२१	५५	९०
पुनर्निर्माण सम्पन्न			१९			२४	४३
पुनर्निर्माण कार्य चालु			४			१७	२१
पुनर्निर्माण कार्य बाँकी			१२			१४	२६

- भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पशुपति क्षेत्र भित्रका सम्पदाहरू मध्ये विश्वरूपा मन्दिर र गौरीघाट चौघेरा सत्तलको पुनर्निर्माणका लागि खरिद प्रक्रियामा रहेको
- दुग्धधारी सत्तलको पुनर्निर्माणका लागि भागवतानन्द सन्यास आश्रमले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले संझौता प्रक्रियामा रहेको ।
- विश्वरूपा मन्दिरमा रहेको विशाल मूर्ति भूकम्पबाट क्षति भई खण्डित भएकोमा हाल मर्मत सभार गरी जडान कार्य समेत सम्पन्न भैसकेको छ ।
- बज्रघर सत्तल को डि.पि. आर तयार गरि पुरातत्व विभागमा सहमतिको लागि पठाइएकोमा सहमति प्राप्त हुन बांकी ।
- पंचदेवल सत्तल र चन्द्रप्रकाशेश्वर सत्तलको डि.पि. आर तयार गर्ने कार्य भैरहेको ।
- पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न भने अझै केही वर्ष लाग्ने अवस्था छ । पुनर्निर्माण कार्य बांकी कार्यको लागि अनुमानित लागत रु. १ अर्ब २५ करोड लाग्ने देखिन्छ ।



६.भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनर्निर्माण प्रगति

२०७७ असार सम्मको कूल पुनर्निर्माण खर्च रु. ५०करोड ९७ लाख ८२ हजार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण	३३ सम्पदा	३४ करोड ८४ लाख ८५ हजार
नेपाल सरकार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना	२ सम्पदा	१० करोड ०६ लाख ९७ हजार
पशुपति क्षेत्र विकासको आन्तरिक श्रोतबाट	४ सम्पदा	३५ लाख
व्यक्ति/संस्था	४ सम्पदा	५ करोड ७१ लाख





धन्यवाद

