



नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय




आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा
एवम् मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान
समिति (MDAC) को बैठक

मिति: २०७८ माघ २८ गते

डा. टोकराज पाण्डे
सह-सचिव
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय



प्रस्तुतीकरणको खाका



- मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको बजेट र खर्चको स्थिति
- पन्ध्रौ योजनाको नतिजा सूचकहरूको प्रगति
- कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको समग्र प्रगति स्थिति
- राष्ट्रिय गौरवका र अन्य आयोजनाहरूको आयोजनागत प्रगति
- मन्त्रालयको समष्टिगत प्रगतिको सारांश
- गुनासो एवम् बेरुजूको स्थिति
- नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको कार्यान्वयन प्रगति
- अघिल्लो MDAC निर्णयको प्रगति



आ.व. २०७८/७९ दोस्रो त्रैमासिक सम्मको खर्चको स्थिति



खर्च शीर्षक	बजेट रु लाखमा		खर्च प्रतिशत
	वार्षिक विनियोजन	खर्च	
चालु	३४००३.३४	१३८०४.९२	४०.६०
पूँजीगत	२२४६१.००	३०३६.४१	१३.५२
वित्तीय	२०६६८५.००	१८४१०.००	८.९१
जम्मा	२६३१४९.३४	३५२५१.३३	१३.३९

विनियोजन रु: २६ अर्ब ३१ करोड ४९ लाख
खर्च रु: ३ अर्ब ५२ करोड ५१ लाख



पन्ध्रौं योजनाको नतिजा सूचकका प्रगतिहरू



प्रमुख नतिजा क्षेत्र	नतिजा सूचक	एकाई	आ.व. २०७८/७९ को लक्ष्य	आ.व. २०७७/७८ को प्रगति	आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति
१. उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय	३५. पर्यटनमा विदेशी मुद्रा आर्जन	अमेरिकी डलर (करोडमा)	१७६.४	३२.८	२७.१
२. सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवम् सघन अन्तर आवद्धता	१६. आन्तरिक हवाई यातायात प्रयोग गर्ने यात्रु	संख्या (लाखमा)	३७.९	१६.७३	१०.३५
	१७. अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात प्रयोग गर्ने यात्रु	संख्या (लाखमा)	५७.९४	११.०५	२.८९



पन्ध्रौं योजनाको नतिजा सूचकका प्रगतिहरू



प्रमुख नतिजा क्षेत्र	नतिजा सूचक	एकाई	आ.व. २०७८/७९ को लक्ष्य	आ.व. २०७७/७८ को प्रगति	आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति
३. सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवम् सघन अन्तर आवद्धता	३२.द्विपक्षीय हवाई सम्झौता भएका मुलुक	संख्या	४२	४०	४१
	३३.अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थल	संख्या	३	१	१
	३४.आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति	संख्या	३९	३७	३७



पन्ध्रौं योजनाको नतिजा सूचकका प्रगतिहरू



प्रमुख नतिजा क्षेत्र	नतिजा सूचक	एकाई	आ.व. २०७८/७९ को लक्ष्य	आ.व. २०७७/७८ को प्रगति	आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति
४. उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व	२. अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान	प्रतिशत	७	२.०५	१.५६
	२८. विदेशी पर्यटक आगमन	संख्या (लाखमा)	२४५०	२.३० (२०१९ को भन्दा ८० % ले घटेको)	१.५० (२०२१)
	२९. विदेशी पर्यटकको औसत बसाई	दिन	१४	१५.१	१५.५ (२०२१)
	३०. प्रति पर्यटक खर्च (प्रति दिन)	अमेरिकी डलर	६३	६५	७०



पन्ध्रौं योजनाको नतिजा सूचकका प्रगतिहरू



प्रमुख नतिजा क्षेत्र	नतिजा सूचक	एकाई	आ.व. २०७८/७९ को लक्ष्य	आ.व. २०७७/७८ को प्रगति	आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति
४. उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व	६३. नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा उपलब्ध सिट	संख्या (लाखमा)	१३०	७८	७८
	३१. पर्यटन क्षेत्रमा थप प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना	संख्या (हजारमा)	-	३.८	-



पन्ध्रौं योजनाको नतिजा सूचकका प्रगतिहरू



प्रमुख नतिजा क्षेत्र	नतिजा सूचक	एकाई	आ.व. २०७८/७९ को लक्ष्य	आ.व. २०७७/७८ सम्मको	आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति
४. उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व	६४. पर्यटन स्तरको होटल बेड				
	५ तारे होटल	होटल संख्या	२४	१४२	२
		बेड संख्या	४९००	१३९००	२५३
	१-४ तारे होटल	होटल संख्या	२२५	-	१०
		बेड संख्या	१९१२५	-	९२४
	अन्य होटल	होटल संख्या	१७४७	११५१ (२०१९मा)	प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको।
		बेड संख्या	५२४१०	३०७९९	
	होमस्टे र क्षमता	संख्या	३८६	३८९ (२०१९मा)	
		बेड संख्या	१५४४	१०८८ (२०१९मा)	



पन्ध्रौं योजनाको नतिजा सूचकका प्रगतिहरु



प्रमुख नतिजा क्षेत्र	नतिजा सूचक	एकाई	आ.व. २०७८/७९ को लक्ष्य	आ.व. २०७७/७८ को प्रगति	आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति
४. उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व	६५. पदमार्ग	कि.मि.	७४६	२२८	२४३
	६६. पहिचान तथा विकास भएका पर्यटकीय गन्तव्यस्थल	संख्या	२२०	प्रदेश नमूना गन्तव्य ७, स्थापित १०० र नयाँ १४८ सहित कुल २५५	७ प्रदेशमा गन्तव्यमा दोस्रो चरणको निर्माण कार्य भइरहेको, ७ वटै प्रदेशमा हिल स्टेशनको रूपमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन भइ भौतिक निर्माणको काम शुरु, २०० स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा २०० वटा पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकासका लागि साझेदारी कार्यक्रम अगाडी बढाइएको।
	६७. पर्यटन क्षेत्रमा उत्पादित दक्ष जनशक्ति	संख्या	१५५००	२०५४	३३०४
५. सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज	२८. प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण	संख्या	२५६०	२०४२	२१३९



कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको समग्र भौतिक प्रगति स्थिति



प्राथमिकता	८०% भन्दा माथि प्रगति भएका	५०% देखि ८०% सम्म प्रगति भएका	५०% भन्दा कम प्रगति भएका	जम्मा
पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना	२	२	४	८
दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त (P2) आयोजना	१	०	४	५
जम्मा	३	२	८	१३



पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) कार्यक्रमहरुको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति

सि. नं.	आयोजना/कार्यक्रम	दोस्रो त्रैमासिक बजेट	प्रगति (%)		प्रगति कम हुनका कारणहरु
			भौतिक	वित्तिय	
१	पुरातात्विक स्थल संरक्षण आयोजना	१९ करोड ९७ लाख	७८.९६	२२.५५	कोभिडका कारण साईटमा नापजाँच गर्न कठिनाई भएकोले समयमा विल पेश नभएकोले वित्तिय प्रगति न्यून देखिएको।
२	विश्व सम्पदा क्षेत्र संरक्षण आयोजना	१२ लाख	८९.००	३१.१८	कोभिडका कारण साईटमा नापजाँच गर्न कठिनाई भएकोले समयमा विल पेश नभएकोले वित्तिय प्रगति न्यून देखिएको।
३	नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण	३२ करोड ६७ लाख	३२.०९	२.२३	१.कोभिडका कारण जनशक्तिको कमी, सामाग्री समयमा साईटमा आई नपुग्ने जस्ता समस्या उत्पन्न भएको। २.साथै, तपसिल बमोजिमका कारणले गर्दा विराटनगर तथा नेपालगंज विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माण कार्यको ठेक्का रद्द गर्न परेको हुनाले सो कार्यको प्रगति हुन नसकेको। • वजेट स्वीकृत हुन ढिलाई, • बहुवर्षीय वजेट नभएको, • गुरुयोजना अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्न वजेट नभएको, • कोभिडका कारण traffic volume घटेको हुनाले redesign गर्न परेको।



पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) कार्यक्रमहरुको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति



सि. नं.	आयोजना/कार्यक्रम	दोस्रो त्रैमासिक बजेट	प्रगति (%)		प्रगति कम हुनका कारणहरु
			भौतिक	वित्तिय	
४	पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	३७ करोड ७८ लाख	८४.४०	४२.२०	बिल भरपाइको भुक्तानी बाँकी रहेकाले वित्तिय प्रगति न्यून रहेको।
५	पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल	३५ करोड	३१.५८	३७.३४	- विमानस्थल क्षेत्र भन्दा बाहिर उत्तरतर्फ करिब ४ कि.मि. पर (मणिपाल, सेति नदि, काहुँखोला) देखि पृथ्वी राजमार्ग तथा भित्री सडकको नालाबाट र सिचाँइको नहरबाट बगेर आउने पानी एकत्रित भई विमानस्थल क्षेत्रमा प्रवेश गरी भित्रका संरचनामा क्षति पुऱ्याउनुका साथै विजयपुर खोला नजिकको जग्गामा पहिरो समेत जाने गरेको। - रिट्टेपानी डाँडा कटान तथा oil डिपो निर्माण कार्य ठोस रुपमा अगाडि नबढेको।



पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) कार्यक्रमहरुको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति



सि. नं.	आयोजना/कार्यक्रम	दोस्रो त्रैमासिक बजेट	प्रगति (%)		प्रगति कम हुनका कारणहरु
			भौतिक	वित्तीय	
६	निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बारा	११ करोड	३०.०० (मास्टर प्लान मात्र)	७.५६	- टाँगिया बस्ति निर्माण क्षेत्रको मध्य भागमा रहेको र सो बस्ती वन क्षेत्र भित्रको सरकारी जग्गामा रहेको। - केही जग्गाधनीहरुले मुआब्जाको लागि निवेदन नदिएको। - रूख कटान आदेश प्राप्त नभएको।
७	पशुपति क्षेत्र विकास कोष	१० करोड ९५ लाख	८०.००	२९.००	कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष र पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति अभाव रहेको।
८	लुम्बिनी विकास कोष	३७ करोड ३० लाख	२२.३०	३५.०१	- लुम्बिनी गुरुयोजनाका बाँकी कार्यहरु, भवन, स्युरेज, ड्रेनेज, सडक, रिभर डाइभर्सन, ल्याण्डस्केप एण्ड व्युटिफिकेशन, नहर लगायतका कार्यहरुको पहिलो फेजको बोलपत्र आव्हान भई कार्य शुरू भएकोमा आयोजना स्थलमा करिव ३५०० रूख कटान गर्नुपर्ने र कटानको लागि जिल्ला बन कार्यालयको नर्स अनसार प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण निर्माण कार्य द्रुततर गतिमा अगाडि बढाउन केही समय लाग्ने। - दोस्रो फेजको बोलपत्र आव्हान गर्न सम्पूर्ण तयारी भए तापनि चालु आ.व.मा विनियोजित बजेट अभाव देखिएकोले बोलपत्र आव्हान गर्न ढिला भइरहेको।



दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त (P2) कार्यक्रमहरुको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति

सि.नं.	आयोजना/कार्यक्रम	दोस्रो त्रैमासिक बजेट	प्रगति (%)		प्रगति कम हुनका कारणहरु
			भौतिक	वित्तिय	
१	हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना	७५ करोड	८.५	९	एडिबिको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने यस आयोजना अन्तर्गत ICB-01 Parallel Taxi Way Extension र ICB-02 Hanger Area Development निर्माण कार्यको बजेट भारले आयोजनाको समग्र प्रगतिमा असर गरेको। उक्त कार्यहरुको मूल्याङ्कन दुई महिना भन्दा पहिले नै सम्पन्न भएतापनि Contract Award सम्बन्धी निर्णय हुन ढिलाई भइरहेकोले समग्र प्रगति कम देखिएको।
२	गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल	२४ करोड	९९.६७	८७.५०	




दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त (P2) कार्यक्रमहरुको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति



सि.नं.	आयोजना/कार्यक्रम	दोस्रो त्रैमासिक बजेट	प्रगति (%)		प्रगति कम हुनका कारणहरु
			भौतिक	वित्तिय	
३	दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना	५७ लाख	०	०	भेरियसन अर्डरको समय थपको लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गरेको। साथै, थप बजेट माग गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको।
४	हवाई सुरक्षा तथा हवाई व्यवस्थापन कार्यक्रम	१९ लाख	२०	१.५	कोभिड १९ का कारणले ICAO Council सभा र हवाई सेवा सम्झौता वार्ता (इण्डोनेसिया, रसिया, कोरिया, कतार आदी) सम्बन्धी कार्य हुन नसकेको। हवाई दुर्घटना सम्बन्धी जाँच अध्ययन सम्बन्धी कार्य गर्न नपरेको।
५	संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम	७ करोड २४ लाख	१८	३५	- खर्च शिर्षकहरु नमिलेकाले संशोधन गर्न परेको। - स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु कोभिड १९ का कारण समयमै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको। - पूँजीगत कार्यक्रम (स्थानीय संग्रहालय र प्रतिमूर्ति संग्रहालय) स्थानीय तहबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तहका नगरप्रमुखहरुसँग छलफल भई कार्यान्वयन हुने प्रक्रिया रहेको।



राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा

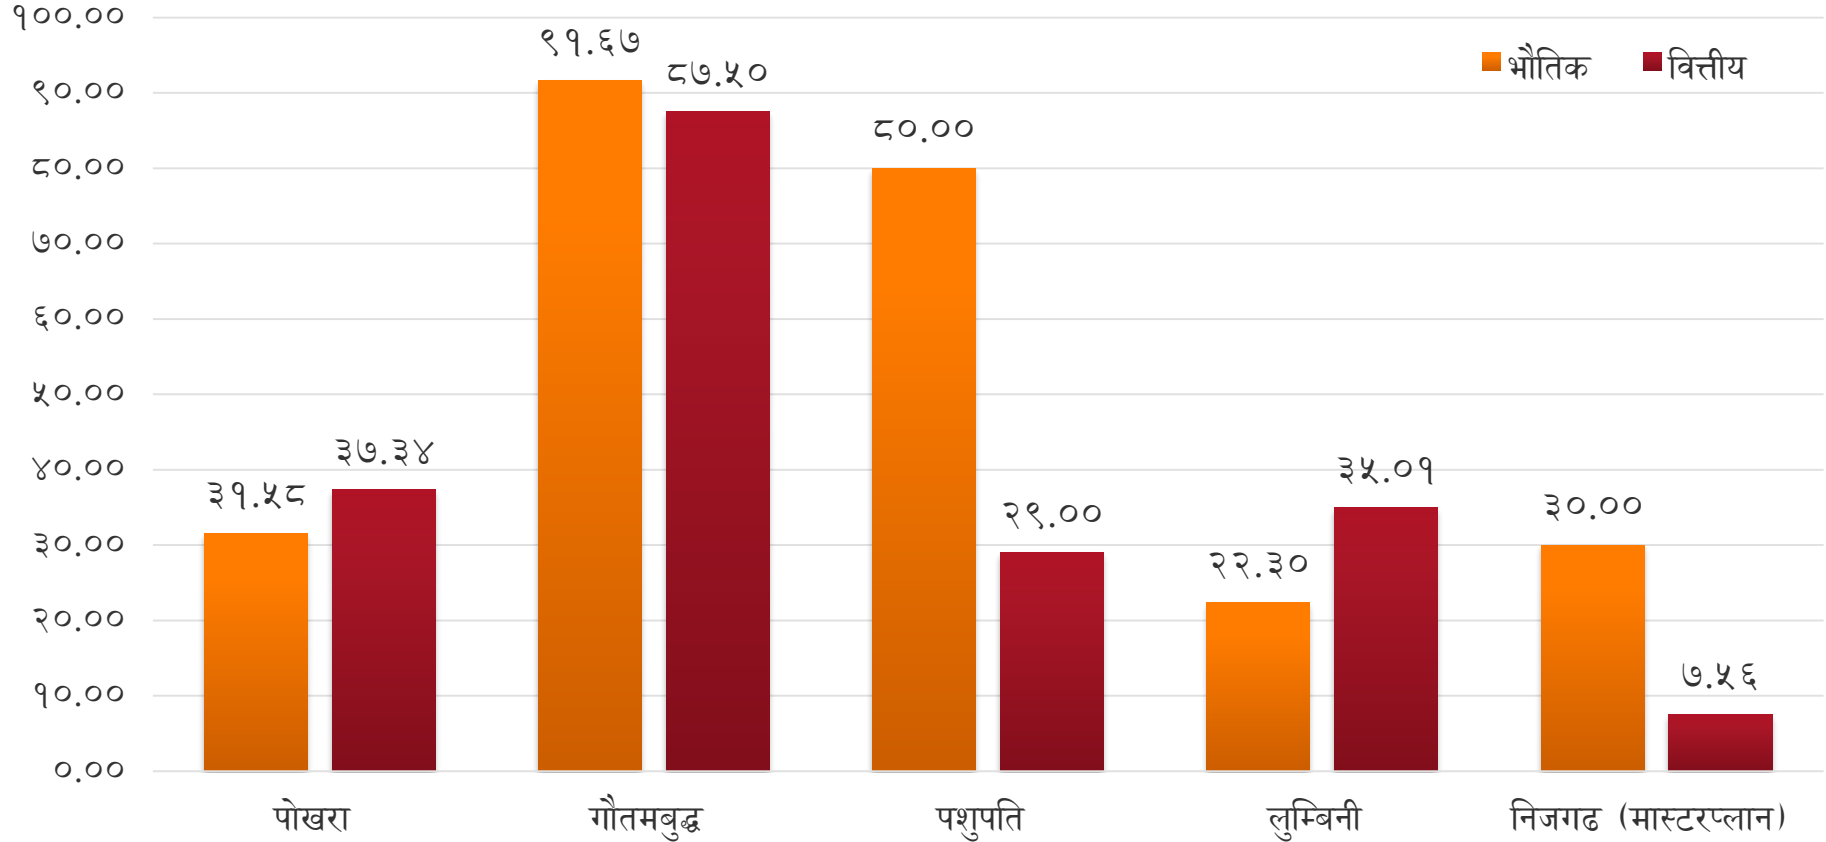




राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हालसम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा




भौतिक वित्तीय

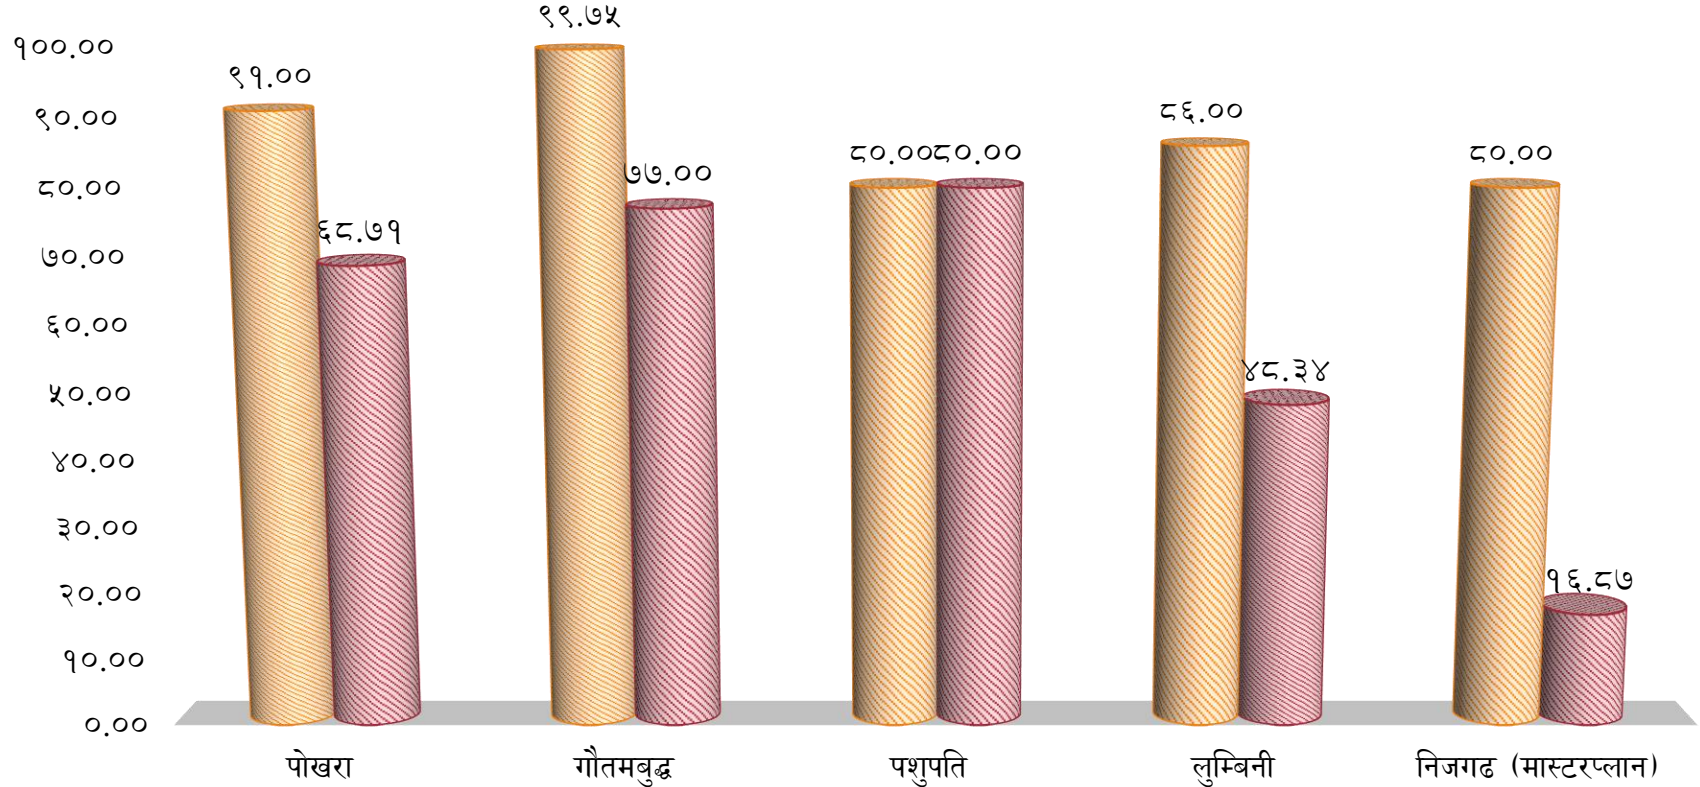



प्रमुख आयोजनाहरूको आ.व. २०७७/७८ र २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिकको भौतिक प्रगति तुलनात्मक स्थिति

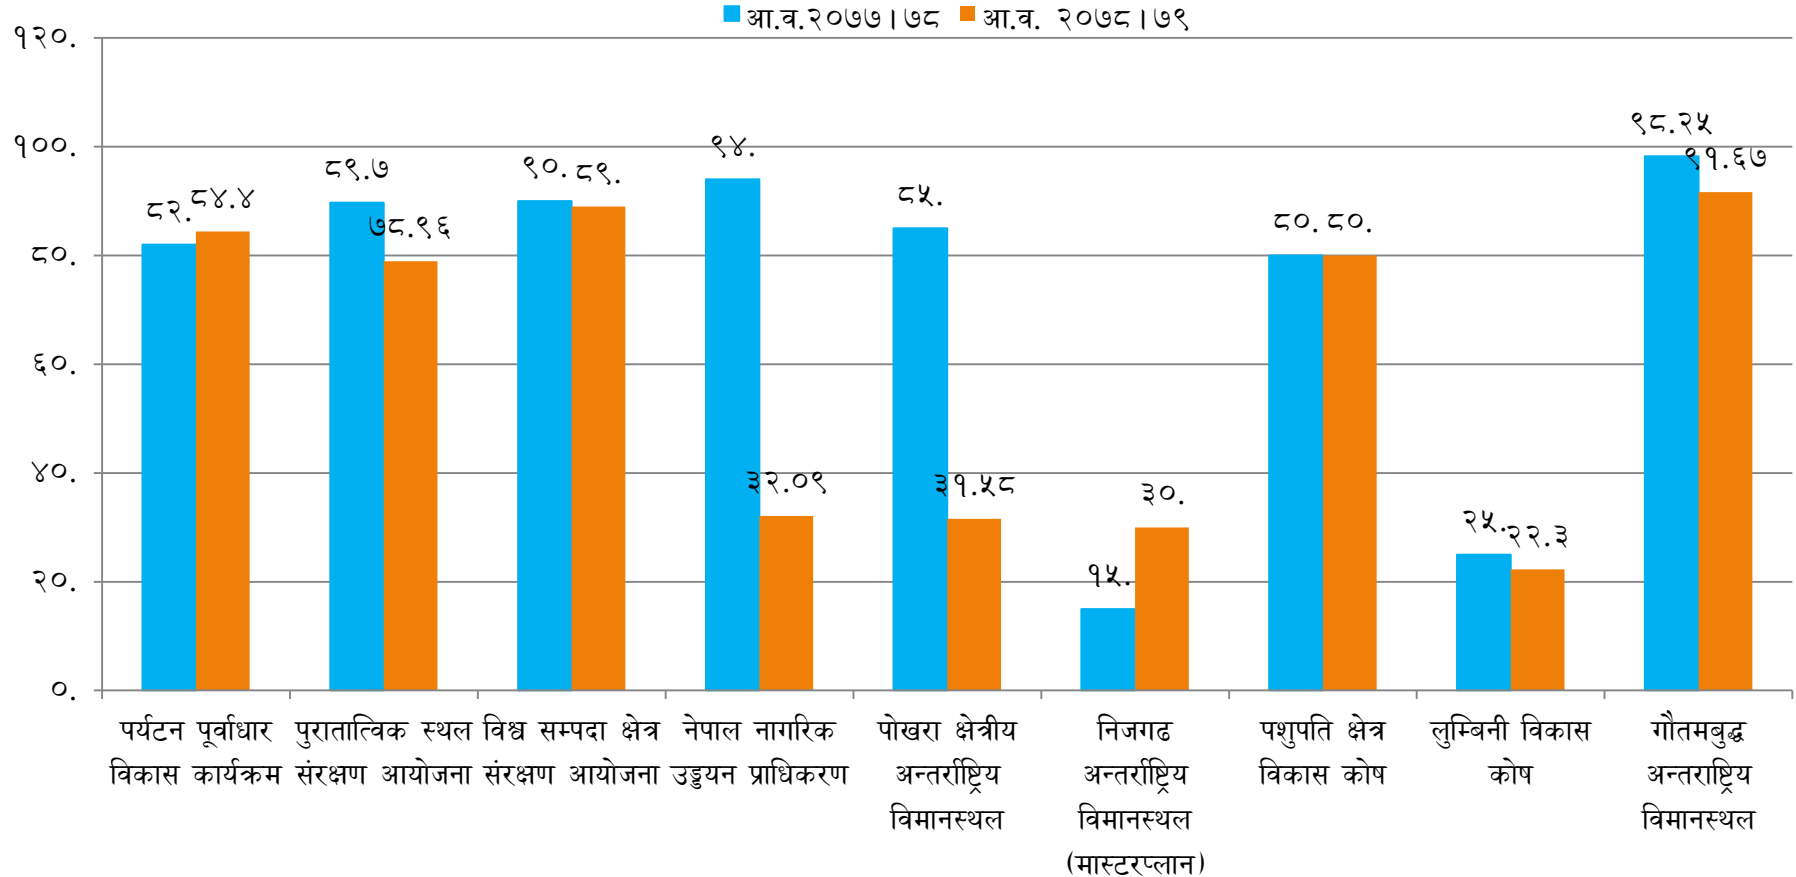



मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको प्रगति



सि.नं.	आयोजना/कार्यक्रम	दोस्रो त्रैमासिक बजेट	प्रगति (%)		प्रगति कम हुनका कारणहरु
			भौतिक	वित्तीय	
१	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	७४ करोड ७७ लाख (चालु र पुँजीगत समेत)	४२	२६.७०	
२	पर्यटन विभाग	१ करोड ५९ लाख	९६.८४	४८.४२	
३	पुरातत्व विभाग (केन्द्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण प्रयोगशाला समेत)	१५ करोड ८३ लाख	८०.८५	६१.८७	
४	राष्ट्रिय अभिलेखालय	१ करोड ४६ लाख	६०	३९	



मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको प्रगति



सि. नं.	आयोजना/कार्यक्रम	दोस्रो त्रैमासिक बजेट	प्रगति (%)		प्रगति कम हुनका कारणहरू
			भौतिक	वित्तिय	
५	राष्ट्रिय संग्रहालय	२ करोड ४ लाख	५०	३५	-
६	नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय	८४ लाख	३०.३७	३०.३७	
७	नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान	११ करोड ४७ लाख	८१	१००	
८	नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान	१ करोड ४६ लाख	९४.५८	२८.८०	-
९	नेपाल संज्ञित तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान	३ करोड २७ लाख	८०.००	३०	-



मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको प्रगति



सि. नं.	आयोजना/कार्यक्रम	दोस्रो त्रैमासिक बजेट	प्रगति (%)		प्रगति कम हुनका कारणहरू
			भौतिक	वित्तीय	
१०	सांस्कृतिक संस्थान	९८ लाख	७५	८६	
११	नारायणहिटी दरबार संग्रहालय	२ करोड ४५ लाख	८१	८१	
१२	भाषा आयोग	२ करोड १७ लाख	६०	४२.७७	
१३	बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति	२ करोड ६ लाख	७९	७४	
१४	नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान	१ करोड ३० लाख	६९.२९	१९.४२	
१५	क्षेत्रीय संग्रहालयहरू (कपिलवस्तु)	१९ लाख	७१.१	३४.५९	



मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको प्रगति



सि.नं.	आयोजना/कार्यक्रम	दोस्रो त्रैमासिक बजेट	प्रगति (%)		प्रगति कम हुनका कारणहरू
			भौतिक	वित्तिय	
१६	संग्रहालयहरू	३	९५.४५	९४.०२	-
१७	ऐतिहासिक दरवारहरू	४० लाख	८०	७७	-
१८	राष्ट्रिय कला संग्रहालय भक्तपुर	६९ लाख	४७.४६	४७.४६	-
१९	स्मारक संरक्षण तथा दरवार हेरचाह कार्यालय भक्तपुर	११ लाख	६८.७२	६७.६७	-
२०	तारागाउँ विकास समिति	८८ लाख	०	०	सदस्य सचिव नियुक्ति नभएकाले कार्यक्रम सञ्चालन नभएको।



संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समष्टिगत प्रगति सारांश



सि.नं.	कार्यक्रम तथा आयोजना	२०७६/७७को सम्मको प्रगति	२०७७/७८को सम्मको अवस्था	२०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति
८.	सञ्चालनमा रहेका विमानस्थल (वटा)	३२	३५	३५
९.	बर्षेभरि सञ्चालन योग्य विमानस्थल (वटा)	३२	३७	३७
१०.	रात्रीकालीन उडान सञ्चालनमा आएका विमानस्थल (वटा)	७	८	८
११.	नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा (वटा)	२८	२७	२२ (२०२१)
१२.	पर्यटकस्तरका होटल (संख्या)	१२५४	१३१३	१२ (थप)
१३.	निर्मित नयाँ पदमार्गको लम्बाई (GHT समेत) (कि.मी.)	२५५	२२८	१५ (थप)



संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समष्टिगत प्रगति सारांश



सि.नं.	कार्यक्रम तथा आयोजना	२०७६/७७को प्रगति	२०७७/७८सम्मको अवस्था	२०७८/७९को दोस्रो त्रैमासिक सम्मको प्रगति
१.	प्रति पर्यटक प्रतिदिन खर्च (डलर)	४८	६५	७० (२०२१)
२.	प्रति पर्यटक औसत बसाई (दिन)	१२.७	१५.१	१५.५
३.	त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नति (प्रतिशत)	९८	यस आ.व.को २२, हालसम्मको ९९	९९
४.	गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (प्रतिशत)	९१	९७.३३	९९.७५
५.	पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (प्रतिशत)	६१	८१	९१
६.	सम्पदा पुनःनिर्माण (संख्या)	४५३	५८९	६२४
७.	पर्यटक आगमन (जना)	११,९७,१९१ (सन २०१९)	२,३०,०८५(सन् २०२०)	१.५० लाख (२०२१)



आ.व. ०७७/७८ को बेरुजु विवरण



क्र.सं.	विवरण
क.	सरकारी तर्फको बेरुजु – १ अर्व २९ करोड फछ्यौट रकम – ३ करोड १४ लाख १७ हजार फछ्यौट प्रतिशत – २.४३% (सर्वोच्च अदालतद्वारा क्यासिनो रोयल्टी, इजाजत नवीकरण दस्तुर असुलीतर्फ ८३ करोड १४ लाख ९६ हजारमध्ये रु. ५४ करोड ९५ लाख ५० हजार बेरुजुको कारवाही नगर्न अन्तरिम आदेश भएको)
ख.	समिति, प्रतिष्ठान, कोषतर्फको बेरुजु – १ अर्व ९० करोड १७ लाख फछ्यौट रकम – २ करोड २० लाख फछ्यौट प्रतिशत – २%



आ.व. २०७८/७९ कात्तिकदेखि पुस मसान्तसम्मको गुनासो व्यवस्थापनको स्थिति



निकाय	जम्मा गुनासो	फछ्यौँट संख्या	फछ्यौँट प्रतिशत
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग	२२	३	१४
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र	०	०	०
हेलो सरकार	२	२	१००
जम्मा	२४	५	



नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना संख्यात्मक विवरण



महिना	माइलस्टोन संख्या	कार्य सम्पन्न	काम भइ रहेका	शुरु नभएका
श्रावण	१६	१	१३	२
भाद्र	११	१	९	१
असोज	३५	१८	१३	४
कात्तिक	१६	२	१०	४
मंसिर	२१	५	८	८
पुस	४४	१८	२०	६
जम्मा	१४३	४५	७३	२५



नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगति



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरू	मुख्य उपलब्धि
बजेट-६६	पर्यटन काज कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने	मस्यौदा तयार भई रायको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
बजेट-१६६	सन्दकपुर, धनुषाधाम, इन्द्रसरोवर, पञ्चासे, निग्लिहवा, कुपिण्डे दह र भादगाउँ लगायतका स्थानमा DPR बमोजिम पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण कार्य	३० प्रतिशत सम्पन्न ।
	आनि गुम्बा र पिण्डस्थान पुनर्निर्माण गर्ने	आनि गुम्बा र पिण्डस्थान पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न ।
बजेट-१६७	उपत्यका वरपर हाईकिङ डेस्टिनेसनमा पूर्वाधार निर्माण	उपत्यका वरपर हाईकिङ डेस्टिनेसनमा पूर्वाधार निर्माण कार्य ७ कि.मी. सम्पन्न ।
	चुरे तथा महाभारत श्रृङ्खलाका सम्भाव्य स्थानमा पर्यटन प्रवर्द्धन	कार्यविधि मस्यौदा तयारी कार्य भइरहेको ।



नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगति



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरू	मुख्य उपलब्धि
बजेट-१६९	कञ्चनजङ्घा, रुवीभ्याली, दोलखा, मकालु, च्छो रोल्पा, अन्नपूर्ण, धौलागिरी, मनास्लु, सगरमाथा लगायतका स्थानमा पदमार्ग निर्माण	खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको।
	आवश्यक GPS Tracking System संचालनको लागि सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गर्ने	GPS Tracking System को लागी २० वटा GPS Device खरिद भई परिक्षणको क्रममा रहेको। पर्वतारोहण र ट्रेकिङको सिजनमा टेस्ट भइपछि पूर्ण रुपमा लागु हुने।
बजेट-१७२	पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन उपज साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन	साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका ६३ स्थानीय तहमा पहिलो किस्ता बापत रु २७१८२६ निकाशा भएको।
बजेट-१७३	मकवानपुर गढी संरक्षण	मकवानपुर गढी संरक्षण प्रथम चरणको कार्यसम्पन्न भएको।
	धार्मिक साँस्कृतिक तथा सिमसार क्षेत्रमा परिपथ निर्माण	खरिद प्रकृया सम्पन्न भएको।



नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगति



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरु	मुख्य उपलब्धि
बजेट-२४०	परम्परागत संस्कृति एवम् पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी सफ्ट पावरको रूपमा विकास गर्ने	- सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न Soft Power Inventory, Photo Documentation गरी प्रचार प्रसार नेपाल पर्यटन बोर्ड मार्फत अगाडी बढाउनु पर्ने। - कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक समन्वय र सहजिकरण भईरहेको।
	लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने	- गत वर्ष प्रकाशित सूचना अनुसारका बाँकी कार्य मध्ये ४ वटा ठेक्का व्यवस्थापन सम्पन्न भई कार्य शुरु भएको। ४ वटा निर्माण कार्यको मोबिलाइजेशन रकम भुक्तानी भई कार्य शुरु भइसकेको। - ड्रइङ्ग, डिजाइन, ल.ई. तथा बोलपत्र कागजात तयार भइरहेको। - नयाँ कार्यक्रमको खरिद सम्झौता तथा कार्यदिशको लागि चालु आ.ब.मा विनियोजित बजेटबाट काम गर्न स्रोत अभाव हुने देखिएकोले चैत्र महिनामा मात्र बोलपत्र आव्हान गर्ने गरी तयारी गरिएको।
बजेट-२४०	बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको एकिकृत गुरुयोजना तयार	- बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजनाको अवधारणा (Conceptual Master Plan) तयार भएको। Detail Project Report (DPR) निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नीतिगत छलफलहरु भइरहेको। - नोमिनेसन डोसेर तयारीको लागि तिलौराकोट कपिलवस्तु वर्ल्ड हेरिटेज इन्सियल प्रोजेक्टको फाइनल रिपोर्ट प्राप्त भएको। जसअनुसार तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदामा सूचिकृत गर्न सन् २०२४ मा नोमिनेशन डोसेर यूनेस्कोमा पेश गर्ने गरी थप विस्तृत कागजातहरु तयार गरिनेछ।



नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगति



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरु	मुख्य उपलब्धि
बजेट- २४०	लुम्बिनी गुरुयोजना अनुसार पवित्र उद्यानमा रहेका गोलाइ पोखरी तथा सर्कुलर लेभीमा लेभिको स्टेच्यण्डर्ड स्लोप निर्माण र पोखरीहरुको गहिराई लेभलिङ्ग लगायत कार्य गरिने	गत आ.व.मा शुरू भएको कार्यको समग्रमा ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भई कार्य चालु अवस्थामा रहेको ।
	५००० मानिस अट्ने हल तथा ध्यान साधना केन्द्र भवन निर्माणको योजना अनुसारको दोस्रो फेजको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ।	गत आ.व.मा शुरू भएको, निर्माण कार्य चालु अवस्थामा रहेको । दोस्रो चरणको निर्माण कार्यको ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको ।



नीति तथा कार्यक्रम र बजेट क्रमशः-



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरु	मुख्य उपलब्धि
बजेट-२४०	गौतमबुद्ध फलपुल बाटीका निर्माण गर्ने र सर्भिस सडक वरिपरि ल्याण्डस्केप निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने	बूक्षारोपण र ल्याण्डस्केपको कार्य चालु अवस्थामा रहेको । दुवैको निर्माण कार्यको ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको ।
	पुरातत्व विभागको समन्वय र स्वीकृतिमा तिलौराकोट, गोटीहवा, निग्लीहवा, अरौराकोट, सिसहनीया, धमनीहवा, सगरहवा, रामग्राम र देवदहमा तीर्थयात्री तथा पर्यटकीय सेवा सुविधा विस्तार गर्न शौचालय, ध्यान प्लेटफर्म, पैदलमार्ग, संरक्षण लगायतका संरचना निर्माण गर्ने	३ वटा कार्यको सम्झौता भई कार्य शुरू भएको ।
	पुरातात्विक उत्खनन् तथा संरक्षणका कार्यहरु गर्ने	उत्खनन् कार्य गर्दा प्राप्त हुने भग्नावशेष र पुरातात्विक अवशेषहरुको सुक्ष्म अध्ययन गर्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त गर्न विज्ञ एवम् अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त पुरातत्वविदको आवश्यकता महशुस भएको हुनाले विज्ञ नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल भइरहेको ।



नीति तथा कार्यक्रम र बजेट क्रमश-



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरु	मुख्य उपलब्धि
बजेट-२४१	वृहत पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना तयारी तथा सो अनुरूप विकास निर्माण गर्ने	मस्यौदा तयार भएको, अन्तिम रूप दिन कार्यटोलीबाट अवधि थपका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार भएको ।
	पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल संरचनाको प्रबलिकरण गर्ने (चादीको ढोका, छाना, गारो लगायत)	संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग र कोष बिच प्रारम्भिक छलफल बैठक सम्पन्न ।
	विश्वरूपा मन्दिर संरक्षण कार्य	खरिद प्रकृत्यामा गएको, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्थगित अवस्था रहेको ।
बजेट-२४१	मृगस्थलीमा भु-क्षय नियन्त्रण गर्ने कार्य	भु-क्षय नियन्त्रण कार्य सम्पन्न भएको ।
	नेपाल वेद विद्याश्रम मा.वि.को प्लस टु भवन तथा पूर्वाधार विकास कार्य	बोलपत्र आव्हान भएको ।



नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगति



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरु	मुख्य उपलब्धि
बजेट-२४१	गौरीघाट चौघेरा सत्तल संरक्षण कार्य	५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न।
	गोठाटार जग्गामा पूर्वाधार विकास तथा सिमाङ्कन	जग्गाको हालसाविक कार्य चालु/नापी तथा मालपोतबाट कायम हुन बाँकी।
	सुरक्षा अनुगमनका लागि विभिन्न उपकरण सि.सि.टि.भी लगायत जडान कार्य	परामर्श लिने कार्य भइरहेको।
	दर्शनमार्ग स्तरोन्नति तथा मर्मत रङ्गरोगन कार्य	कार्य सम्पन्न
	दाफा भजनघर संरक्षण कार्य	सम्झौता प्रकृत्यामा।



नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगति



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरू	मुख्य उपलब्धि
बजेट-२४१	राम मन्दिर पूर्वका मन्दिरहरू जीर्णोद्धार कार्य	खरिद प्रकृत्यामा।
	अग्नीहोत्रशाला तथा चार शिवालय संरक्षण कार्य	६० प्रतिशत कार्य सम्पन्न।
	गौरीघाटका शिवालय जीर्णोद्धार कार्य	पठाइएको डिपीअर तयार गरी पुरातत्व विभागमा सहमतिका लागि पठाइएको।
	श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको भौतिक अवस्था अध्ययन कार्य	संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग र कोषबीच प्रारम्भिक छलफल बैठक सम्पन्न।
	मृगस्थलीमा पाताल भएको सत्तललाई पुनर्निर्माण गर्नको लागि डि पी आर तयार गर्ने	TOR तयार गर्ने कार्य भइरहेको।



नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगति



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरु	मुख्य उपलब्धि
बजेट-२४१	पशपति क्षेत्रको निकास ढलको विस्तृत अध्ययन तथा नक्साङ्कन कार्य	TOR तयार गर्ने कार्य भइरहेको ।
	पुनर्निर्माण बांकी सम्पदाको विस्तृत ड्रइङ्ग डिजाइन कार्य	जितजंग प्रकाशेश्वर सत्तलको परामर्स सेवा सम्झौता सम्पन्न ।
बजेट-२४२	तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचिमा सूचिकृत गर्न प्रकृया अगाडि बढाइने	नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८।९।३० को निर्णयानुसार संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा भएको ।
	जानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचिमा सूचिकृत गर्न प्रकृया अगाडि बढाइने	जनकपुर उपमहानगरपालिकाबाट क्षेत्र निर्धारण गरी नक्शांकनको पूर्व तयारी सम्पन्न भएको ।



नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगति



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरु	मुख्य उपलब्धि
बजेट-२४२	अष्टावक्र शास्त्रार्थ सहितको धार्मिक सम्मेलन आयोजना	समिति गठन प्रक्रियामा रहेको।
	चितवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर निर्माण	क्षेत्र पहिचानका लागि विज्ञ टोलीसंग छलफल भईरहेको।
बजेट-२४५	राष्ट्रिय साँस्कृतिक संग्रहालय निर्माण	चालु आ.व.०७८/७९ मा विनियोजित बजेट किर्तिपुर न.पा. मा पठाउने सम्बन्धमा आवश्यक छलफल भैरहेको।
	प्रादेशिक संग्रहालय निर्माण	प्रादेशिक संग्रहालय निर्माणको मापदण्ड तथा ढाँचा तयार गर्न प्रदेश सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने काम भईरहेको।



नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगति



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरु	मुख्य उपलब्धि
बजेट-३५२	निजगढ विमानस्थल गुरुयोजना निर्माण	गुरुयोजना तयार गर्ने कार्य जारी रहेको। (हालसम्म ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको ।) (Interim Design Report प्राप्त भएको)
	निजगढ विमानस्थल जग्गा अधिग्रहण कार्य	हालसम्म ७०-१-९-४ क्षेत्रफल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना) को नाममा नामसारी भएको।
	नदि कटान नियन्त्रण गर्ने	लागत अनुमान र सूचना प्रकाशन गर्ने कार्य जारी रहेको।



नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगति



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरु	मुख्य उपलब्धि
बजेट-३५३	त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति	• ट्याक्सीवे विस्तार तथा ह्याङ्गर निर्माणको लागी Contract award भए पश्चात मात्र कार्य अगाडी बढ्ने । • भौतिक प्रगति: ५.६ % • वित्तिय प्रगति : ४.३५ % (Dec,2021 सम्म) • पुस महिना सम्म २,८१,००० घ.मी माटो (१३%) ल्याइ laying and compaction गरीसकेको र प्रगति सुधारोन्मुख रहेको । • sub-surface drainage को कार्य निरन्तर रहेको । • नेपाल अर्मीको Golf Course स्थानान्तरण गर्न पटक पटक बैठक तथा समन्वय भइ नेपाल आर्मी Golf hole सार्ने प्रक्रियामा रहेको ।
	त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा रुपान्तरण गरिनेछ	Canopy Construction कार्य हालसम्म ९१ प्रतिशत सम्पन्न भएको ।



नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगति



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरु	मुख्य उपलब्धि
बजेट-३५४	गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थप निर्माण कार्य	ठेक्का व्यवस्थाको लागि Detail Design र Cost Estimate तयार गर्ने कार्य भैरहेको।
	गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने (हालसम्म ९७ प्रतिशत सम्पन्न)	- प्रथम चरणको बाँकी ३ प्रतिशत कार्य मध्ये पुस महिनासम्ममा जम्मा २.७५ प्रतिशत कार्यसम्पन्न। - ICB-01 अन्तर्गतको AGL, Signage तथा अन्य उपकरण जडान एव Runway Light परिक्षण कार्य सम्पन्न तथा फर्निचर फर्निसिङ्ग सम्बन्धि कार्य अन्तिम चरणमा। Calibration Flight का लागि तयारी भइरहेको। - उपकरण जडान तथा फिनिसिङ्ग कार्य अन्तिम चरणमा। सरसफाईको काम चालु।
	गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनामा Cargo Building देखि Apron सम्मको सडक निर्माण गर्ने।	ठेक्का व्यवस्थाको लागि Detail Design र Cost Estimate तयार गर्ने कार्य भैरहेको।



नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगति



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरू	मुख्य उपलब्धि
बजेट-३५४	गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा periphery Road निर्माण गर्ने ।	ठेक्का व्यवस्थाको लागि Detail Design र Cost Estimate तयार गर्ने कार्य भैरहेको ।
	गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको पुरानो Runway लाई Rehabilitation गरि नयाँ parallel Taxiway निर्माण गर्ने ।	ठेक्का व्यवस्थाको लागि Detail Design र Cost Estimate तयार गर्ने कार्य भैरहेको ।
	पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।	- निर्माण कार्य हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत र यस पुस - Runway, Taxiway, Apron र Hanger Apron कार्य सम्पन्न । - Airfield Ground lighting system installation तथा Testing कार्य सम्पन्न । - High-Mast Flood Light र Access Road Street Light जडान गर्ने कार्य सम्पन्न । - विमानस्थल Isolated Parking को Pavement निर्माण कार्य सम्पन्न तथा विमानस्थलमा भित्रि Periphery Road को ७०% कार्य सम्पन्न । - Terminal, ATC Tower, Hanger लगायत सबै १४ वटा भवनहरूको Concrete/Steel Structure तथा छाना छाउने (Roofing) कार्य सम्पन्न ।



नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगति



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरु	मुख्य उपलब्धि
बजेट-३५५	इलाम, गुल्मी र डोल्पा विमानस्थल निर्माण तथा परिक्षण उडान गर्ने	• इलामको सुकिलुम्बामा परीक्षण उडान सम्पन्न भएको । • गुल्मीको सिमिचौर विमानस्थलमा कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा रहेको । • डोल्पाको मासिनेचौर विमानस्थल निर्माण कार्य चालु रहेको ।
	अर्घाखाँची विमानस्थल निर्माण	• अर्घाखाँची विमानस्थलको धावनमार्ग, ट्याक्सि वे, एप्रोन कालोपत्रे तथा ड्रेनेजको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई निर्माण कार्य प्रारम्भ । माटो काट्ने काम ५०% सम्पन्न ।
	जनकपुर र राजविराज विमानस्थल स्तरोन्नती	• चैनलिङ्क फेन्सिङको काम सम्पन्न, ड्रेनेज मर्मत कार्य सम्पन्न, रनवे ग्राडिङ तथा अन्य कार्य भईरहेको । • राजविराज विमानस्थलमा धावनमार्ग ट्याक्सिवे एप्रोन ड्रेनेज निर्माण कार्य सम्पन्न



नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगति



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरू	मुख्य उपलब्धि
बजेट-३५४	तुम्लिङटार विमानस्थल स्तरोन्नती	तुम्लिङटार विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल टावर भवन निर्माण कार्य चालु रहेको। Structure को काम सम्पन्न भई Finishing को काम हुदै गएको।
	बैतडी पाटन विमानस्थल स्तरोन्नती	बैतडी पाटन विमानस्थलमा नया टर्मिनल टावर भवनको फाउन्डेसन, लोअर टाई विमको, DPC तथा पहिलो तलाको कोलुम कासटिडको काम सम्पन्न। Drainage निर्माणको कार्य सम्पन्न।
	नेपालगञ्ज र विराटनगर विमानस्थल स्तरोन्नती	नेपालगञ्ज र विराटनगर विमानस्थलमा Redesign गर्ने कार्य सुरु।
	दाङको नारायणपुर विमानस्थल निर्माण गर्ने	दाङको नारायणपुर विमानस्थल निर्माण कार्य गर्नको लागि Detail Feasibility Study अन्तिम चरणमा रहेको।



नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगति



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरू	मुख्य उपलब्धि
बजेट-३५६	ओखलढुंगाको खिजी चण्डेश्वरी विमानस्थल संचालनमा ल्याउने	टेष्ट फ्लाइटको लागि तयारी भईरहेको।
	ताप्लेजुङ सुकेटारको धावनमार्ग विस्तार कार्य	माटोको काम सम्पन्न। Sub base को काम सम्पन्न। Base को काम सम्पन्न। Asphalt Concrete को लागि तयारी हुदै।
	चुहानडाँडा विमानस्थल निर्माण	Detailed Feasibility Study को प्रारम्भिक तयारी हुदै।
बजेट-३८	लिम्चुङबुङ दोबाटो सगरमाथा अवलोकन हलेसी वृहत पर्यटन पूर्वाधार विकास लिम्चुङबुङ उदयपुर DPR बमोजिमको पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण कार्य शुरु गर्ने।	टेन्डर डकुमेन्ट तयार हुदै गरेको।



नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगति



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरु	मुख्य उपलब्धि
बजेट-३८	जनयुद्ध संग्रहालय निर्माण रूकुम पश्चिम DPR तयार गरि निर्माण कार्य सुरु गर्ने ।	स्थानीय तहमा कार्यक्रम हस्तान्तरण भएको ।
	पोखरा मनाङ मुस्ताङ पर्यटकीय सर्किट विस्तार DPR तयार गरि निर्माण कार्य सुरु गर्ने ।	परामर्श दाता छनौट भै कार्यान्वयनमा रहेको ।
	रारा फोक्सुण्डो एडभेन्चर टुरिजम तथा छाँयानाथ, लिमी, कैलाश दर्शन पर्यटन पूर्वाधार DPR तयार गरि निर्माण कार्य सुरु गर्ने ।	कार्यक्रम संशोधनको लागि पेश भएको ।
	खप्तड क्षेत्र वृहत पर्यटन पूर्वाधार (रामारोशन, मालिका शुक्लाफाँटा समेत) DPR तयार गरि निर्माण कार्य सुरु गर्ने ।	परामर्श दाता छनौट भै कार्यान्वयनमा रहेको ।



नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रगति



बुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलापहरु	मुख्य उपलब्धि
बजेट-३८	ककनीमा क्यासिनो ग्राम पूर्वाधार निर्माण DPR तयार गरि निर्माण कार्य सुरु गर्ने ।	कार्यक्रम संशोधनको लागि पेश भएको ।
बजेट-३९	नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा शासकीय इतिहास समेट्ने संग्रहालय निर्माण DPR तयार गरि निर्माण कार्य सुरु गर्ने ।	कार्यक्रम संशोधनको लागि पेश भएको ।



मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिबैठक (२०७८ कात्तिक २८) को निर्णयहरूको प्रगति स्थिति

निर्णय	कार्य प्रगति
१. सबै निकायहरूले आफूले सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमहरू/योजनाहरू प्रत्येक महिना गर्ने कार्यक्रमहरूको Framework सहित पेश गर्ने र त्यसको नियमित प्रगति प्रतिवेदन अर्को महिनाको ७ गते भित्र गर्ने भनी मन्त्रालयको बैठकबाट निर्णय भै पठाइ सकिएको र हाल सम्मको प्रगति सन्तोषजनक नभएको हुँदा Action Plan तयार गरी सो को प्रगति अनिवार्य रूपमा प्रत्येक महिना पठाउने। आगामी दिनमा आफ्नो प्रगति सन्तोषजनक स्पष्टताका साथ देखिने गरी गर्ने र प्रस्तुति गर्ने।	नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भई प्रगति विवरण प्राप्त भएको।
२. अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरसफाइ लगायत यात्रुहरूका लागि आवश्यक उपयुक्त प्रतिक्षालय, शौचालय, स्तनपान कक्ष लगायत सुविधाको प्रबन्ध तत्काल गर्ने व्यवस्था मिलाउने।	नियमित सरसफाइ हुँदै गरेको। खानेपानी, टेलिफोन लगायतका सुविधा र निशुल्क सटल बसको प्रबन्ध भएको। स्तनपान कक्षको प्रबन्ध गरिएको।



मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठक (२०७८ कात्तिक २८) को निर्णयहरूको प्रगति स्थिति



निर्णय	कार्य प्रगति
३. पर्यटन क्षेत्रको जनशक्ति सम्बन्धी अध्ययन तथा लेखाजोखा गरि विवरण अद्यावधिक गर्ने साथै अपुग जनशक्ति उत्पादन गरी व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धित निकायबाट अध्ययन गराइ प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।	स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था नभएकाले यस सम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल भइरहेको ।
४. यस मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा सुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययीता र कुशलता पूर्वक कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइ सबै पदाधिकारीहरू एवम् कर्मचारीहरूबाट उपलब्धीमूलक नतिजा आउने गरी कार्य गर्न/गराउन व्यवस्था मिलाइ उदाहरणीय एवम् नमुना कर्मचारी एवम् कार्यालय बनाउन विशेष पहल गर्ने ।	सूचनाको स्वसकृय प्रकाशनको काम नियमित भइरहेको । कार्यविवरणका आधारमा कर्मचारीको उपलब्धिलाई मापन गर्ने गरिएको । सबै कर्मचारीहरूले आफूलाई तोकिएको कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको ।

सुझाव

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा लैजानुपर्ने विषय कुनै भएमा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।



धन्यवाद
